

REFERENZ

Kaiserburg Nürnberg

Mauerabschnitt Himmelsstallung
2018-2019

Die Himmelsstallung ist ein nach 1945 erneuerter Fachwerkbau auf einem Sandsteinquadersockel und bildet das Untergeschoss der Stallungsgebäude.

Der Fassadenabschnitt befindet sich auf einem - nur über eine Steintreppe oberhalb des Parkplatzes „Am Ölberg“ zugänglichen - Gartenplateau. Zu bearbeitende Bereiche befinden sich an einem Gebäudeabschnitt der Vorburg der Nürnberger Kaiserburg oberhalb der südl. Stützmauern „Am Ölberg“.

Maßnahmen

- Untersuchungen baubegleitend
- Mikropartikelreinigung
- Salzminderung
- Festigung
- Sicherung Risse und Schalen
- Fugensanierung
- Ergänzung, Altergänzung
- Entfernu gn Kleinteile
- Neuteile / Verblender / Vierungen

Ort

Nürnberg

Datierung

15./16. Jahrhundert

Auftraggeber

Staatliches Bauamt Nürnberg-Erlangen

Fachbauleitung

ProDenkmal GmbH

Denkmalpflegerische Betreuung


Stadt Nürnberg, Untere
Denkmalschutzbehörde

Bearbeitungszeitraum

2018-2019

Material

Burgsandstein, Sandstein, Ziegel

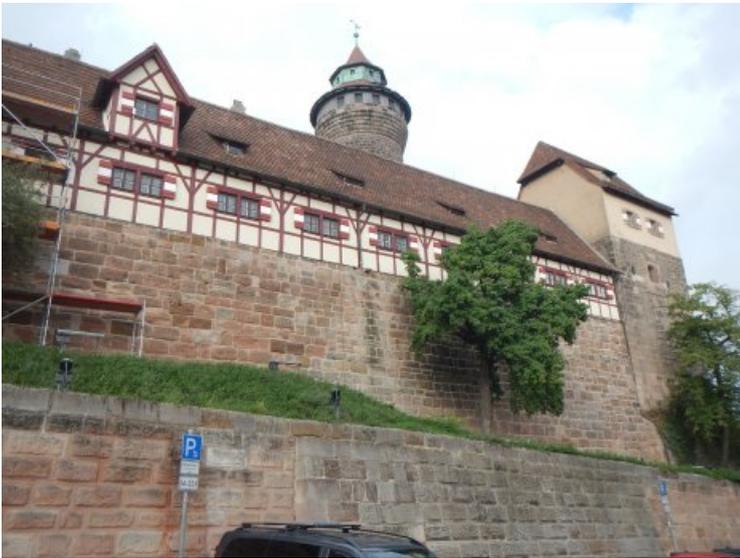

Kaiserburg Südmauer Himmelsstall nach der Maßnahme.



zu bearbeitende Mauerabschnitt, die Himmelsstall an der Kaiserburg; VORZUSTAND



Efeubewuchs am Quadermauerwerk im unteren Bereich; VORZUSTAND



Defekte Fugen sowie Ausblühung
bauschädlicher Salze; VORZUSTAND



Wurzelnde Pflanzen in den Fugen;
VORZUSTAND



Wurzelnde Pflanzen wurden aus den
Fugen entfernt, Fugen durch
angepassten Fugenmörtel verschossen;
NACHZUSTAND



Defekte Fugen, Schalen und schwarze Krusten am Mauerwerk; VORZUSTAND



Defekte Fugen wurden entfernt und durch Fugenmörtel ausgetauscht, Fehlstellen ergänzt, Schalen gesichert oder entfernt und schwarze Krusten reduziert; NACHZUSTAND



Defekte Ziegelauswicklungen, vermutlich durch verschließen von Balkenlöchern entstanden; VORZUSTAND



Defekte Ziegelauszwickungen wurden neu verfugt, partiell wurden defekte Ziegel ausgetauscht, Fugen abschließend mit angepasstem Fugenmörtel verschlossen; NACHZUSTAND





Die Mauerkrone wurde restauriert, neu verputzt und zur Gewährleistung des Wasserablaufes durch Mörtelkeil verputzt; ZWISCHENZUSTAND



Große Zwischenräume wurden mit Ziegel ausgewickelt, die Mauerkrone schräg zulaufend verputzt; ZWISCHENZUSTAND

